OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축 사업

사업수행계획서

0.사업관리 · PM-01

항목	내용
문서번호	EduMS-PM-01
버전	v1.0 (샘플)
작성일	2026-11-04
작성자	홍길동 (가상)
검토자	발주기관 사업담당자
수행기관	가나다소프트 (가상)
발주기관	OO 기관 (가상)

※ 이 문서는 산출물의 모양과 구성을 보여 주기 위한 샘플입니다. 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이며 실제와 무관합니다.

작성 안내 (샘플 전용 — 실제 문서에서는 삭제)

항목	내용
이 문서의 목적	사업의 범위·일정·조직·방법론을 정하고 발주기관과 합의하는 최상위 계획 문서
작성 시점	착수 직후(착수보고 전)
작성자 / 검토자	PM / 발주기관 사업담당자
선행 자료	제안서, 계약서, 과업지시서
필수 여부	필수
반드시 담을 내용	사업개요·범위(포함/제외), 추진조직과 역할, 일정, 방법론, 산출물 목록, 위험·품질·형상 관리 방안, 보안 대책
완성 판단 기준	과업지시서의 모든 과업이 범위에 반영돼 있고, 산출물 목록이 계약서와 1:1 로 일치한다
자주 나오는 미비점	제외 범위를 적지 않음 / 산출물 목록이 계약과 다름 / 조직도에 역할 책임이 없음

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인
v0.1	2026-10-20	홍길동	초안 작성	-
v0.9	2026-10-28	홍길동	내부 검토 의견 반영	박품질
v1.0	2026-11-04	홍길동	발주기관 검토 의견 반영, 확정	김 OO

목차

1. 사업 개요

2. 사업 범위

3. 추진 조직 및 역할

4. 추진 일정

5. 관리 방안

1. 사업 개요


항목	내용
사업명	OO 기관 통합 교육관리시스템(EduMS) 구축
사업기간	2026.03.02 ~ 2026.10.30 (8 개월)
발주기관	OO 기관 정보화담당관
수행기관	가나다소프트(가상)

2. 사업 범위

구분	포함 범위	제외 범위
기능	과정관리, 수강신청, 출결, 성적관리	결제·PG 연동
인프라	WAS/DB 이중화 구성	기관 내 네트워크 증설
데이터	기존 교육이력 5 년치 이관	5 년 이전 이력

3. 추진 조직 및 역할

역할	담당	주요 책임
PM	홍길동	사업 총괄, 발주기관 소통
분석·설계	김분석	요구사항·설계 산출물
개발	이개발 외 3 명	구현, 단위시험
품질(QA)	박품질	산출물 검토, 시험 총괄

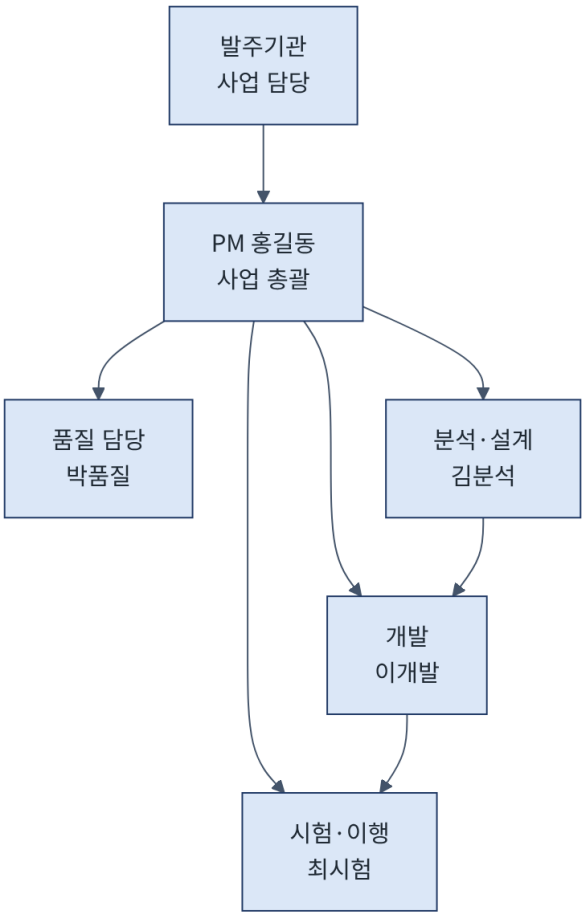

[그림 1] 추진 조직도 (가상)

4. 추진 일정

단계	시작	종료	주요 산출물
분석	03.02	04.10	요구사항 정의서
설계	04.13	06.05	화면·DB·인터페이스 설계서
구현	06.08	08.14	소스, 단위시험 결과서
시험·이행	08.17	10.30	통합시험 결과서, 이행계획서

5. 관리 방안

- 품질: 산출물 2 단계 검토(동료→QA) 후 발주기관 검토
- 형상: Git 저장소, 산출물은 공유폴더 버전 관리
- 위험: 월 1 회 위험 점검 회의
- 보안: 개발서버 접근통제, 개인정보는 가명 데이터 사용

— 끝 —
